



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

RELATORIO COMPLETO DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025





INDICE

1.TERMO DE ABERTURA DO PROJECTO.....	1
1.1.JUSTIFICATIVA.....	1
1.2.OBJETIVOS.....	1
1.3.PRODUTOS ESPERADOS (ENTREGAS).....	2
1.4.PREMISSAS.....	2
1.5. RESTRIÇÕES.....	2
1.6. RISCOS INICIAIS.....	2
1.7.STAKEHOLDERS PRINCIPAIS.....	3
2.DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PROJECTO.....	4
2.1.REQUISITOS FUNCIONAIS.....	4
2.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	4
2.3.REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS.....	5
2.4.REQUISITOS DE USUABILIDADE.....	5
2.5. REQUISTOS DE SEGURANÇA.....	5
2.6. REQUISITO DE DADOS.....	6
3.ESTRUTURA ANALITICA DO PROJECTO.....	7
3.1.VISUALIZAÇÃO DE ESBOÇO.....	7
3.2.ESTRUTURA HIERARQUICA.....	10
4.CRONOGRAMA DO PROJECTO.....	14
3.1.CRONOGRAMA POR FASES.....	14
4.2.ALOCACAO DE ORCAMENTOS.....	17
4.3.EQUIPE E SALARIOS MENSAIS.....	17





4.4.MATRIZ RASCI	19
5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO.....	21
5.1.OBJECTIVO	21
5.2.METODOLOGIA	21
4.3.REGISTO DOS RISCOS	21
5.4.PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO.....	22
5.5.RESPONSABILIDADES	22
5.6.FERRAMENTAS.....	23
6.PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO	24
6.1.OBJECTIVO	24
6.2.STAKEOLDERS PRINCIPAIS	24
6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇÃO	25
6.4.PADROES DE COMUNICAÇÃO.....	25
6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS.....	26
7.DOCUMENTO DE TERMINO DO PRROJECTO	27
7.1.OBJECTIVO	27
7.2.RESUMO DAS ENTREGAS	27
7.3.AVALIACAO DOS RESULTADOS	28
7.4. LIÇÕES APRENDIDAS	28
7.5. RECOMENDAÇÃO DE ENCERRAMENTO	28
8.ANEXO	29
8.1.INQUERITO DE PESQUISAS NO GOOGLE FORMS.....	29



1.TERMO DE ABERTURA DO PROJECTO

A agricultura urbana e periurbana tem ganhado destaque como alternativa viável para combater a insegurança alimentar e gerar rendimentos em centros urbanos. Em Angola, essa prática ainda carece de ferramentas digitais eficazes para apoiar o planeamento, monitoramento e previsão de colheitas. O projeto AgroKianda surge como solução inovadora ao oferecer um sistema inteligente baseado em IA para apoiar agricultores urbanos e periurbanos.

1.1.JUSTIFICATIVA

Angola possui milhares de agricultores urbanos informais que operam sem ferramentas digitais para previsão de produtividade, planeamento de cultivo ou acesso estruturado ao mercado. O AgroKianda visa suprir essa lacuna e contribuir com:

- Aumento da produtividade
- Redução de desperdícios
- Inclusão tecnológica
- Sustentabilidade alimentar

1.2.OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema inteligente para apoiar a agricultura familiar urbana e periurbana, com foco em previsão de colheitas e gestão agrícola.

Objetivos Específicos:

- Implementar IA para previsão de colheitas com base em clima, solo e histórico de cultivo.
- Criar módulo de planeamento de safra.
- Disponibilizar ferramentas para controle de insumos e vendas.
- Conectar agricultores a mercados locais.





1.3.PRODUTOS ESPERADOS (ENTREGAS)

- Plataforma web/mobile responsiva (MVP funcional);
- Algoritmo de IA treinado para previsão de colheitas;
- Módulo de planeamento agrícola;
- Painel de gestão de insumos e vendas;
- Módulo de conexão com compradores locais (marketplace simplificado).

1.4.PREMISSAS

- Acesso mínimo à internet por parte dos usuários finais.
- Participação ativa dos agricultores em testes e validações.

1.5. RESTRIÇÕES

- Limitações orçamentárias para escalar rapidamente a solução.
- Baixa alfabetização digital de parte do público-alvo.
- Dependência de dados climáticos confiáveis e atualizados.

1.6. RISCOS INICIAIS

- Resistência à adoção tecnológica por agricultores tradicionais.
- Falta de engajamento de parceiros comerciais e governos locais.
- Desafios no treinamento dos modelos de IA por falta de dados históricos suficientes.



1.7.STAKEHOLDERS PRINCIPAIS

Nome	Papel	Interesse do Projecto
Agricultores Urbanos	Usuários Finais	Uso da plataforma para melhorar suas produções
Equipe de Desenvolvimento	Execução Técnica	Entregar uma solução funcional e escalável
Instituições Governamentais	Parceiros Estratégicos	Apoiar políticas públicas agrícolas
Empresas compradoras	Clientes Finais	Obter produtos agrícolas com mais previsibilidade



2.DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PROJECTO

2.1.REQUISITOS FUNCIONAIS

São funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seus objetivos.

1. O sistema deve permitir o cadastro de agricultores com seus dados pessoais e localização.
2. O sistema deve disponibilizar um painel de planeamento de safra com base nas culturas escolhidas.
3. O sistema deve permitir a inserção de dados sobre clima, tipo de solo e histórico de cultivo.
4. O sistema deve gerar previsões de colheitas com base em modelos de IA.
5. O sistema deve disponibilizar alertas sobre condições climáticas que impactem as colheitas.
6. O sistema deve permitir o cadastro e controle de insumos agrícolas (sementes, fertilizantes, etc.).
7. O sistema deve gerar relatórios de produção, produtividade e desempenho.
8. O sistema deve possuir um módulo de gestão de vendas (quantidade, destino, valor).
9. O sistema deve conectar agricultores com compradores locais, em um mini-marketplace.
10. O sistema deve permitir ao agricultor avaliar as vendas e o desempenho das safras.
11. O sistema deve oferecer visualizações gráficas das análises de produtividade.
12. O sistema deve funcionar em plataforma web e mobile com interface responsiva.
13. O sistema deve permitir notificações (via SMS, e-mail ou push).

2.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

São critérios de qualidade e desempenho do sistema.

1. O sistema deve estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana.
2. O tempo de resposta das páginas deve ser inferior a 3 segundos.
3. A aplicação deve ser responsiva e adaptável a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
4. O sistema deve ser desenvolvido com código modular e documentado.
5. Deve haver mecanismos de backup automático dos dados semanalmente.
6. O sistema deve ser multilíngue (português inicialmente, com possibilidade de expansão).
7. O sistema deve ser escalável para suportar um grande número de usuários.
8. O sistema deve ter baixo consumo de dados para uso em áreas com internet limitada.



2.3.REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

Obrigatoriedades legais que o sistema deve cumprir.

1. O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários, conforme a **Lei de Proteção de Dados Pessoais de Angola (Lei n.º 22/11)**.
2. O sistema deve garantir consentimento explícito para uso de dados de agricultores.
3. Os dados coletados não poderão ser compartilhados com terceiros sem autorização.
4. O sistema deve garantir rastreabilidade de alterações nos dados dos usuários.
5. O marketplace deve emitir notas de transação conforme exigências fiscais, caso aplicável.

2.4.REQUISITOS DE USUABILIDADE

Focados na experiência do usuário.

1. A interface deve ser intuitiva e acessível mesmo para usuários com baixa literacia digital.
2. O sistema deve oferecer tutoriais simples para primeiros acessos.
3. Os ícones devem ser representativos e acompanhados de texto explicativo.
4. Deve haver suporte a comandos por voz (em fases futuras, se viável).
5. As telas devem evitar excesso de informações visuais por página.

2.5. REQUISITOS DE SEGURANÇA

Garantem integridade e proteção da aplicação.

1. O sistema deve utilizar autenticação com senha segura e criptografia de dados sensíveis.
2. Deve haver níveis de permissão para diferentes tipos de usuários (agricultor, administrador, comprador).
3. O sistema deve bloquear acessos após tentativas falhadas sucessivas.
4. Deve ser implementado HTTPS em toda a aplicação.
5. Deve haver auditoria de ações realizadas por usuário



2.6. REQUISITO DE DADOS

Focados na coleta, estrutura e uso dos dados.

1. O sistema deve armazenar dados climáticos, de solo e histórico agrícola de cada usuário.
2. Os dados utilizados para IA devem ser anonimizados e tratados com responsabilidade.
3. O sistema deve permitir análise histórica de produtividade por cultura e região.
4. Os dados devem ser organizados de forma relacional e segura.
5. O sistema deve permitir extração de insights para políticas públicas.



3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJECTO

3.1. VISUALIZAÇÃO DE ESBOÇO

1. Iniciação do Projeto

- 1.1 Elaboração do Termo de Abertura
- 1.2 Identificação e análise dos stakeholders
- 1.3 Definição do escopo inicial
- 1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

- 2.1 Planeamento do cronograma
- 2.2 Planeamento de custos e orçamento
- 2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe
- 2.4 Planeamento de comunicação e riscos
- 2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

- 3.1 Entrevistas com agricultores e instituições
- 3.2 Definição dos requisitos funcionais
- 3.3 Definição dos requisitos não funcionais
- 3.4 Requisitos legais e regulatórios
- 3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

- 4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
- 4.2 Design da base de dados
- 4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)
- 4.4 Definição da IA e modelos preditivos
- 4.5 Validação e aprovação da arquitetura

5. Desenvolvimento do Sistema



- 5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento
- 5.2 Desenvolvimento do backend
- 5.3 Desenvolvimento do frontend
- 5.4 Implementação do módulo de IA
- 5.5 Integração com serviços externos
- 5.6 Testes unitários e de integração
- 6. Testes e Validação
 - 6.1 Elaboração de plano de testes
 - 6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais
 - 6.3 Validação com grupo piloto de agricultores
 - 6.4 Ajustes com base no feedback
 - 6.5 Documentação de bugs e correções
- 7. Treinamento e Capacitação
 - 7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais
 - 7.2 Capacitação dos agricultores
 - 7.3 Treinamento da equipe técnica local
 - 7.4 Sessões de apoio pós-lançamento
- 8. Lançamento do Sistema
 - 8.1 Configuração do ambiente de produção
 - 8.2 Migração de dados e revisão final
 - 8.3 Lançamento oficial do sistema
 - 8.4 Divulgação e engajamento
 - 8.5 Monitoramento pós-implantação
- 9. Monitoramento e Avaliação
 - 9.1 Monitoramento de uso e desempenho
 - 9.2 Coleta de feedback dos usuários



9.3 Relatórios de impacto

9.4 Atualizações e melhorias contínuas

10. Encerramento do Projeto

10.1 Avaliação final com stakeholders

10.2 Entrega formal das documentações

10.3 Apresentação dos resultados

10.4 Encerramento contratual e administrativo

10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto



3.2. ESTRUTURA HIERARQUICA

Nivel	Codigo WBS	Nome Elemento
1	1	Iniciação do Projeto
2	1.1	Elaboração do Termo de Abertura
2	1.2	Identificação e análise dos stakeholders
2	1.3	Definição do escopo inicial
2	1.4	Aprovação do projeto pelos patrocinadores
1	2	Planeamento do Projeto
2	2.1	Planeamento do cronograma
2	2.2	Planeamento de custos e orçamento
2	2.3	Planeamento de recursos humanos e equipe
2	2.4	Planeamento de comunicação e riscos
2	2.5	Planeamento de qualidade e métricas
1	3	Levantamento e Análise de Requisitos
2	3.1	Entrevistas com agricultores e instituições
2	3.2	Definição dos requisitos funcionais
2	3.3	Definição dos requisitos não funcionais
2	3.4	Requisitos legais e regulatórios
2	3.5	Aprovação da documentação de requisitos



1	4	Arquitetura e Design do Sistema
2	4.1	Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
2	4.2	Design da base de dados
2	4.3	Protótipos de interface (wireframes e mockups)
2	4.4	Definição da IA e modelos preditivos
2	4.5	Validação e aprovação da arquitetura
1	5	Desenvolvimento do Sistema
2	5.1	Configuração do ambiente de desenvolvimento
2	5.2	Desenvolvimento do backend
2	5.3	Desenvolvimento do frontend
2	5.4	Implementação do módulo de IA
2	5.5	Integração com serviços externos
2	5.6	Testes unitários e de integração
1	6	Testes e Validação
2	6.1	Elaboração de plano de testes
2	6.2	Execução de testes funcionais e não funcionais
2	6.3	Validação com grupo piloto de agricultores
2	6.4	Ajustes com base no feedback
2	6.5	Documentação de bugs e correções
1	7	Treinamento e Capacitação



2	7.1	Criação de manuais e vídeos tutoriais
2	7.2	Capacitação dos agricultores
2	7.3	Treinamento da equipe técnica local
2	7.4	Sessões de apoio pós-lançamento
1	8	Lançamento do Sistema
2	8.1	Configuração do ambiente de produção
2	8.2	Migração de dados e revisão final
2	8.3	Lançamento oficial do sistema
2	8.4	Divulgação e engajamento
2	8.5	Monitoramento pós-implantação
1	9	Monitoramento e Avaliação
2	9.1	Monitoramento de uso e desempenho
2	9.2	Coleta de feedback dos usuários
2	9.3	Relatórios de impacto
2	9.4	Atualizações e melhorias contínuas
1	10	Encerramento do Projeto
2	10.1	Encerramento contratual e administrativo
2	10.2	Avaliação final com stakeholders
2	10.3	Entrega formal das documentações
2	10.4	Apresentação dos resultados



2	10.5	Lições aprendidas e arquivamento do projeto
---	------	---



4. CRONOGRAMA DO PROJECTO

3.1. CRONOGRAMA POR FASES

1. Iniciação do Projeto

- 1.1 Elaboração do Termo de Abertura
- 1.2 Identificação e análise dos stakeholders
- 1.3 Definição do escopo inicial
- 1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

- 2.1 Planeamento do cronograma
- 2.2 Planeamento de custos e orçamento
- 2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe
- 2.4 Planeamento de comunicação e riscos
- 2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

- 3.1 Entrevistas com agricultores e instituições
- 3.2 Definição dos requisitos funcionais
- 3.3 Definição dos requisitos não funcionais
- 3.4 Requisitos legais e regulatórios
- 3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

- 4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
- 4.2 Design da base de dados
- 4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)
- 4.4 Definição da IA e modelos preditivos
- 4.5 Validação e aprovação da arquitetura



5. Desenvolvimento do Sistema

- 5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento
- 5.2 Desenvolvimento do backend
- 5.3 Desenvolvimento do frontend
- 5.4 Implementação do módulo de IA
- 5.5 Integração com serviços externos
- 5.6 Testes unitários e de integração

6. Testes e Validação

- 6.1 Elaboração de plano de testes
- 6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais
- 6.3 Validação com grupo piloto de agricultores
- 6.4 Ajustes com base no feedback
- 6.5 Documentação de bugs e correções

7. Treinamento e Capacitação

- 7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais
- 7.2 Capacitação dos agricultores
- 7.3 Treinamento da equipe técnica local
- 7.4 Sessões de apoio pós-lançamento

8. Lançamento do Sistema

- 8.1 Configuração do ambiente de produção
- 8.2 Migração de dados e revisão final
- 8.3 Lançamento oficial do sistema
- 8.4 Divulgação e engajamento
- 8.5 Monitoramento pós-implantação

9. Monitoramento e Avaliação

- 9.1 Monitoramento de uso e desempenho



9.2 Coleta de feedback dos usuários

9.3 Relatórios de impacto

9.4 Atualizações e melhorias contínuas

10. Encerramento do Projeto

10.1 Avaliação final com stakeholders

10.2 Entrega formal das documentações

10.3 Apresentação dos resultados

10.4 Encerramento contratual e administrativo

10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto



4.2.ALOCACAO DE ORCAMENTOS

FASE	PERCENTAGEM	PREÇO
Iniciação	5%	150.000
Planeamento	10%	300.000 Kz
Levantamento & Análise	15%	450.000 Kz
Arquitetura & Design	15%	450.000 Kz
Desenvolvimento	35%	3.000.000 Kz
Testes & Validação	10%	300.000 Kz
Treinamento	5%	150.000 Kz
Lançamento	3%	90.000 Kz
Monitoramento & Avaliação	2%	60.000 Kz
Encerramento	0%	
		4.950.000 Kz

4.3.EQUIPE E SALARIOS MENSAIS



Função	Total de Horas	Meses	Salário Mensal	Custo Total	Observações
Gerente de Projeto	840	5	200.000	1.000.000	Coordenação, planejamento, gestão
Analista de Requisitos	168	1	180.000	180.000	Requisitos no início do projeto
Arquiteto de Software	168	1	180.000	180.000	Design da arquitetura inicial
Desenvolvedor Backend	504	3	200.000	600.000	Lógica de negócio, integrações
Desenvolvedor Frontend	504	3	200.000	600.000	Interface do usuário
Engenheiro de Dados/IA	336	2	200.000	400.000	IA para previsão de colheitas
QA/Testador	168	1	150.000	150.000	Testes finais e validação
Técnico de Treinamento	168	1	120.000	120.000	Capacitação de usuários
Suporte Técnico / DevOps	168	1	150.000	150.000	Deploy, infraestrutura
Designer UX/UI	168	2	100.000	200.000	Design de telas,



					experiência do usuário
Especialista em Agronegócio	168	2	120.000	240.000	Orientação técnica para agricultura urbana

4.4.MATRIZ RASCI

Atividade / Entregável	Gestor do Projeto	Analista de Negócio	Arquiteto de Software	Desenvolvedor	QA/Testador	Especialista em Treinamento	Designer UI/UX	Cliente/Stakeholders
Termo de Abertura	R	A						C
Planeamento do Projeto	R	A						C
Levantamento de Requisitos	A	R						C
Análise de Requisitos	A	R						C
Design da Arquitetura do Sistema	C	A	R					I
Design de Interfaces (UI/UX)	C	A	C				R	C
Desenvolvimento do Backend	C		A	R				I



Desenvolvimento do Frontend	C		C	R				I
Integração e Testes Unitários	C		C	R	A			I
Testes Funcionais e de Aceitação	C	A			R			I
Preparação de Documentação Técnica	A	R	C					I
Preparação de Material de Treinamento	A					R		C
Sessões de Treinamento	C					R		A
Implantação do Sistema	R	C	C	A				I
Monitoramento Pós-Implantação	R	A	C	C	R			I
Encerramento e Avaliação Final	R	A	C					C



5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO

5.1.OBJECTIVO

Este documento tem como objetivo identificar, analisar e propor estratégias de resposta aos riscos do projeto **AgroKianda**, visando garantir que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo de 5 meses e do orçamento de 4.950.000 Kz.

5.2.METODOLOGIA

A gestão de riscos será feita de forma contínua ao longo do projeto, utilizando a análise qualitativa (probabilidade × impacto), categorização e estratégias de mitigação ou resposta.

4.3.REGISTO DOS RISCOS

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia de Resposta	Responsável
R1	Atrasos no levantamento de requisitos	Técnico	Média	Alto	Alto	Realizar reuniões semanais e utilizar formulários digitais	Analista de Requisitos
R2	Dificuldade na integração dos módulos	Técnico	Alta	Alto	Crítico	Garantir arquitetura modular e testes de integração contínuos	Arquiteto de Software
R3	Falta de engajamento dos stakeholders	Organizacional	Média	Médio	Médio	Workshops e apresentações mensais de progresso	Gerente de Projeto
R4	Indisponibilidade de membros da equipe	Recursos Humanos	Média	Médio	Médio	Ter planos de substituição e backup de pessoal	Gerente de Projeto



ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia de Resposta	Responsável
R5	Estouro de orçamento	Financeiro	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento mensal de gastos e revisão de escopo	Controller Financeiro
R6	Ataques de segurança ou perda de dados	Segurança	Baixa	Crítico	Alto	Implementar criptografia e backups regulares	Especialista em Segurança
R7	Problemas técnicos com IA de previsão de colheitas	Técnico	Alta	Alto	Crítico	Prototipagem inicial e uso de dados históricos confiáveis	Engenheiro de Dados
R8	Não adesão dos agricultores ao sistema	Estratégico	Média	Alto	Alto	Realizar testes pilotos e ações de capacitação	Responsável de Treinamento

5.4. PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO

- **Revisões quinzenais** de riscos em reuniões de status.
- Atualização da matriz de riscos conforme evolução do projeto.
- Ações corretivas imediatas caso algum risco se materialize.
- Indicadores de performance de riscos (ex: número de riscos ativos, riscos mitigados por mês).

5.5. RESPONSABILIDADES

- **Gerente de Projeto:** coordenação geral da gestão de riscos.



- **Cada responsável por área:** monitoramento dos riscos da sua frente.
- **Equipe Técnica:** reporte imediato de ocorrências ou sinais de risco.

5.6.FERRAMENTAS

- Planilha de Riscos (Excel)
- Ferramenta de Gestão (Click Up)
- Reuniões de acompanhamento com atas formais



6. PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO

6.1. OBJECTIVO

Assegurar que todas as partes interessadas estejam adequadamente informadas sobre o progresso, decisões, riscos e resultados do projeto AgroKianda ao longo dos 5 meses de execução.

6.2. STAKEOLDERS PRINCIPAIS

Stakeholder	Função no Projeto
Patrocinador (Investidor)	Financiamento e decisões estratégicas
Gerente de Projeto	Planejamento, execução e controle do projeto
Equipe Técnica (Dev, Design, QA)	Execução técnica do sistema
Agricultores Representantes	Usuários finais / Validação de requisitos
Parceiros Tecnológicos	Apoio tecnológico e consultoria
Governo / Entidades reguladoras	Conformidade e regulação



6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

Tipo de Comunicação	Objetivo	Responsável	Frequência	Canal	Participantes
Reunião de Kick-off	Alinhar objetivos e iniciar o projeto	Gerente de Projeto	1x (início)	Presencial / Zoom	Todos os stakeholders
Reuniões de Planeamento	Definir plano e tarefas	Gerente de Projeto	1x por fase	Zoom / Google Meet	Equipe de Projeto
Relatório de Status	Informar progresso	Gerente de Projeto	Semanal	E-mail / PDF	Patrocinador, Stakeholders-chave
Reunião de Avaliação	Validar entregas	Gerente de Projeto	Ao fim de cada fase	Presencial / Zoom	Equipe e Agricultores
Comunicação de Riscos	Notificar e gerir riscos	Gerente de Projeto	Conforme necessário	E-mail / WhatsApp	Patrocinador, Técnicos
Relatório Final	Apresentar resultados do projeto	Gerente de Projeto	Final do projeto	Presencial + PDF	Todos os stakeholders
Atualizações Informais	Alinhar equipe técnica e tirar dúvidas	Líder Técnico	Diária	WhatsApp / Slack	Equipe Técnica

6.4.PADROES DE COMUNICAÇÃO

- Toda comunicação oficial deve ser registrada por e-mail ou em documentos compartilhados no Google Drive.
- As atas de reuniões devem ser emitidas até 24h após a realização.
- As reuniões devem ser agendadas com no mínimo 48h de antecedência.



6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS

- **Email:** Comunicação formal com stakeholders.
- **Zoom:** Reuniões remotas.
- **Discord:** Comunicação ágil entre equipe técnica.
- **Google Drive:** Armazenamento de documentos e relatórios.
- **Click Up:** Acompanhamento de tarefas e cronograma.



7.DOCUMENTO DE TERMINO DO PRROJECTO

7.1.OBJECTIVO

Este documento visa formalizar o encerramento oficial do Projeto AgroKianda, confirmando que todos os objetivos definidos foram alcançados conforme os critérios estabelecidos no plano do projeto, e que os produtos entregues foram aceites pelos stakeholders..

7.2.RESUMO DAS ENTREGAS

Nº Entrega	Status
1 Termo de Abertura	Concluído
2 Documento de Requisitos	Concluído
3 Estrutura Analítica do Projeto (WBS)	Concluído
4 Cronograma Detalhado	Concluído
5 Alocação de Recursos e Orçamento	Concluído
6 RASCI e Plano de Comunicação	Concluído
7 Protótipo funcional	Concluído
8 Testes e Validações	Concluído
9 Treinamento dos usuários	Concluído
10 Implantação e Lançamento	Concluído



7.3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

- **Qualidade:** Todos os critérios de qualidade definidos foram cumpridos.
- **Prazo:** O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido de 5 meses.
- **Custo:** O projeto foi executado dentro do orçamento de 3.000.000 Kz.
- **Satisfação do Cliente:** Os stakeholders manifestaram satisfação com os produtos entregues.

7.4. LIÇÕES APRENDIDAS

- A importância de um plano de comunicação claro contribuiu para o alinhamento entre as equipes.
- A definição de riscos e mitigação precoce evitou atrasos nas fases críticas.
- A equipe demonstrou alto desempenho apesar de um orçamento enxuto.


7.5. RECOMENDAÇÃO DE ENCERRAMENTO

Com base na verificação e validação das entregas e no aceite formal dos stakeholders, recomenda-se o encerramento oficial do Projeto AgroKianda.



8.ANEXO

8.1.INQUERITO DE PESQUISAS NO GOOGLE FORMS

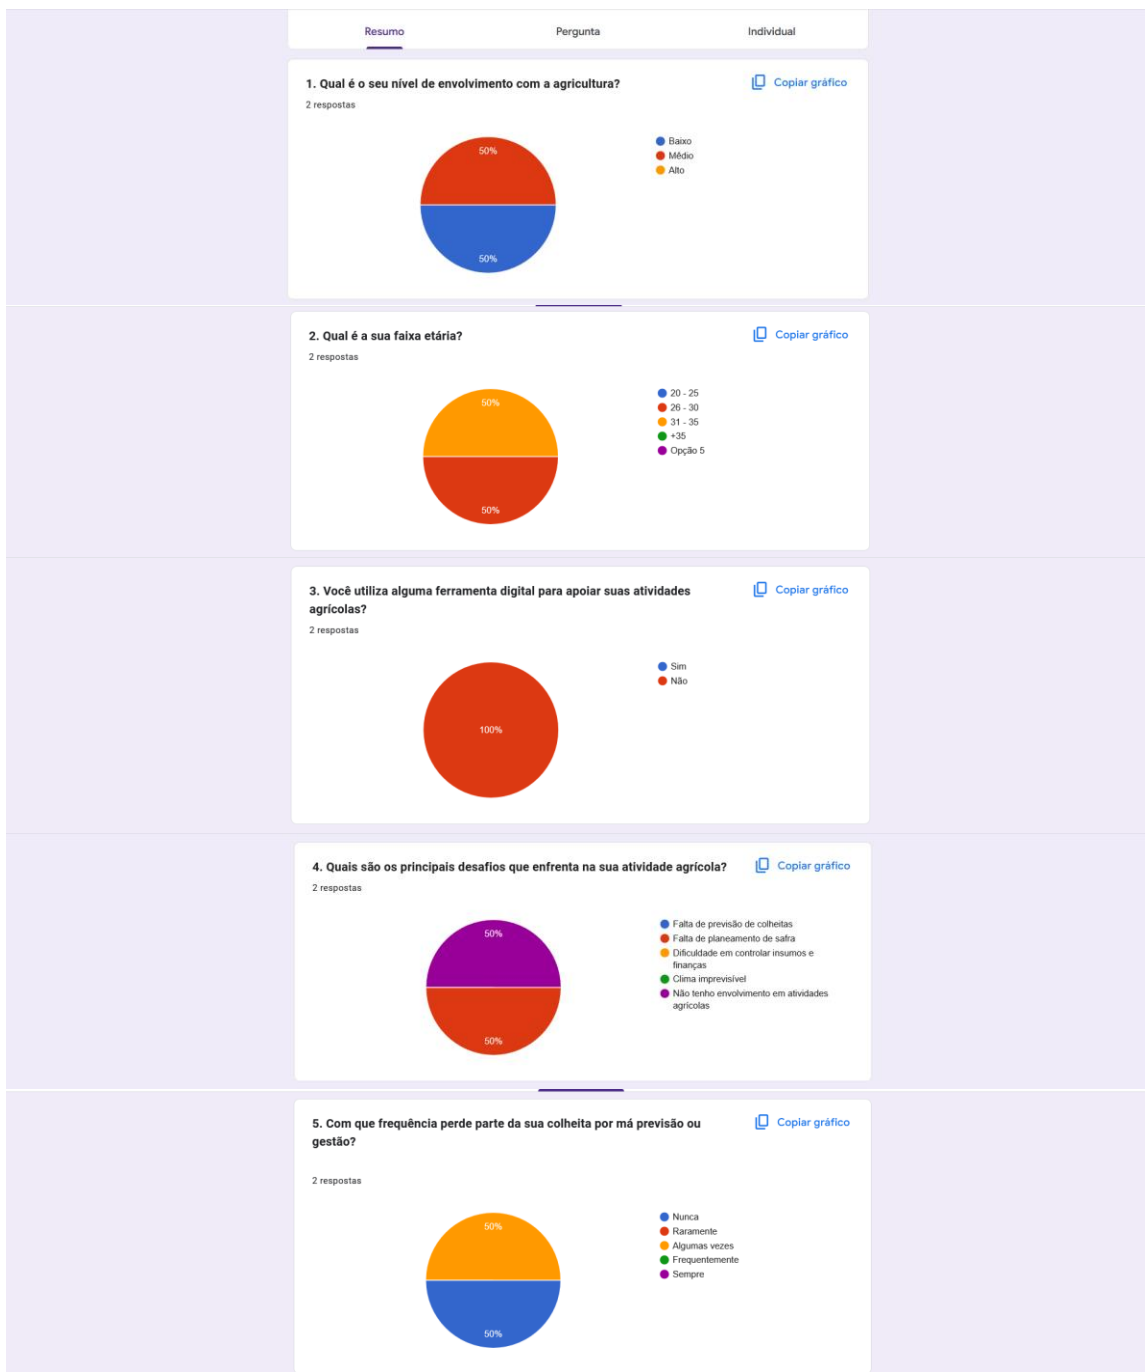




6. Estaria disposto(a) a usar uma aplicação com Inteligência Artificial para prever colheitas e planejar suas plantações?

[Copiar gráfico](#)


2 respostas



7. Você considera útil uma plataforma que também conecta agricultores a compradores locais (mercado digital)?

[Copiar gráfico](#)

2 respostas



8. Qual das funcionalidades abaixo considera mais importante em uma aplicação como AgroKianda?

[Copiar gráfico](#)

2 respostas

